

第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事
建設工事の進捗写真
令和7年4月
工事全景



南西



小山広域保健衛生組合

南東




焼却施設エリア



工事概要：ごみピットの底面は完成いたしました。5月からは周囲の壁の打設を進めます。周辺基礎は地下部が完了し、1階フロアの柱や壁の配筋が始まっています。


小山広域保健衛生組合

焼却施設エリア（直上）

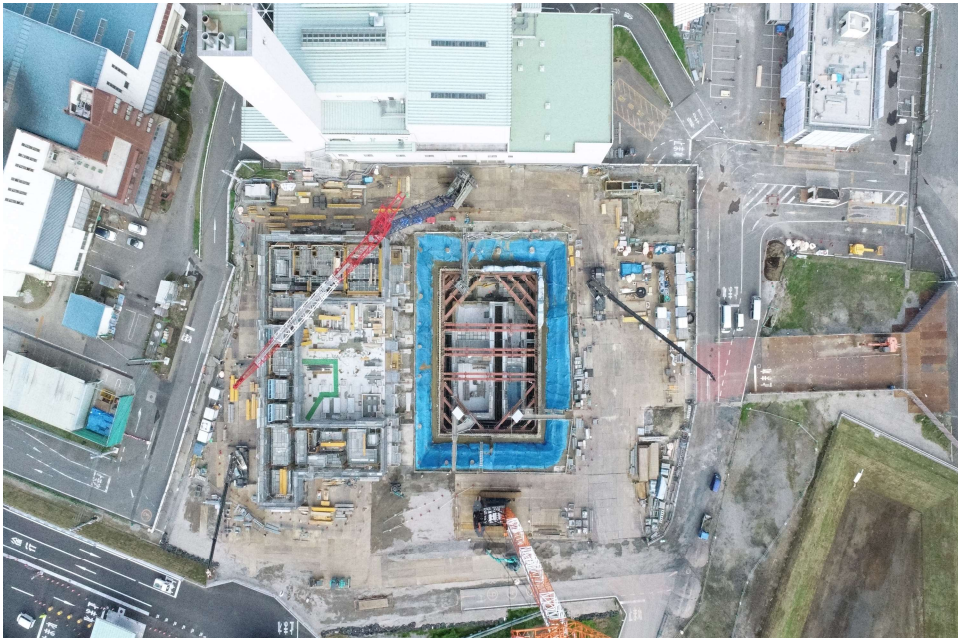

工事概要：直上から見ると、ゴミピットの底面コンクリートができて
いることが分かります。内部足場を組んで壁を施工いたします。周辺
も、足場を組んで1階フロアの壁や柱の施工をしていることが確認で
きます。

旧管理棟エリア

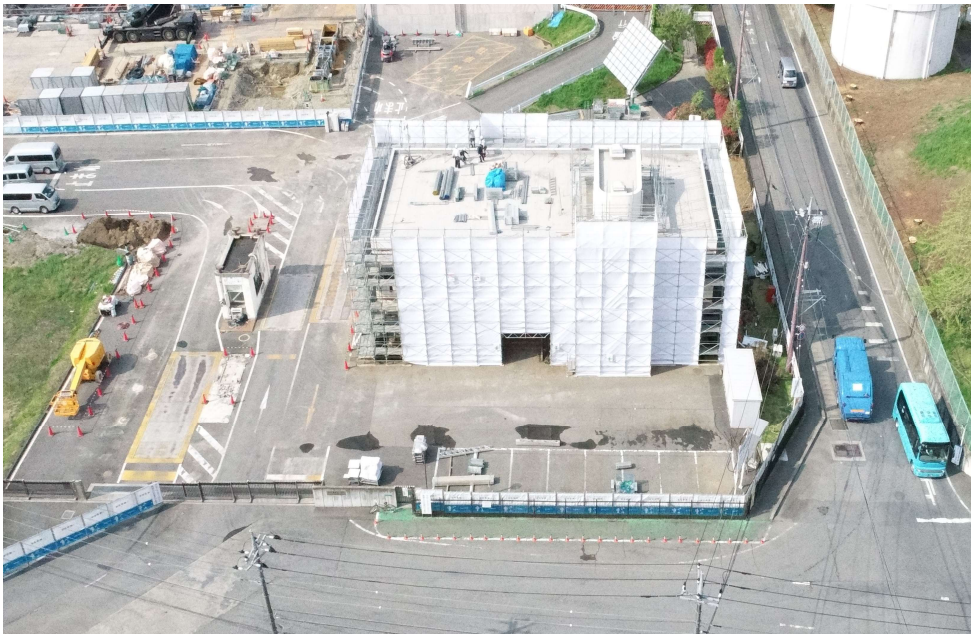

工事概要：4月から追加となった工事エリアです。新計量棟エリアが
令和7年4月から稼働したことにより、役割を終えた旧管理棟・旧計量
棟を解体する準備を行っています。

小山広域保健衛生組合
