

第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事
建設工事の進捗写真
令和7年7月
工事全景



南西



小山広域保健衛生組合

南東




焼却施設エリア



工事概要：引き続き、ごみピット内部の壁を打設しております。壁の打設は、8月中旬まで続く予定です。ゴミピット北の建物は、鉄骨工事が開始されました。

小山広域保健衛生組合

焼却施設エリア（直上）

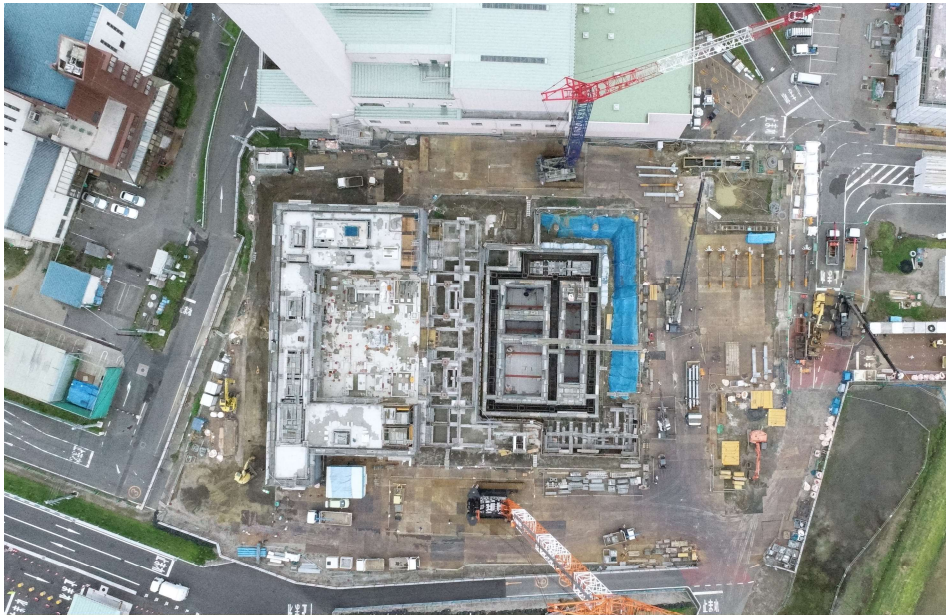

工事概要：ごみピットの内部は、次回が最後の地下躯体打設となります。8月下旬からは地上の建物との接続するための工事となります。写真では、まだ鉄骨が設置されておりませんが、搬入された鉄骨が右側中央に並んでいます。順次設置を行います。

旧管理棟エリア



工事概要：旧管理棟エリアでは、内装の撤去を引き続き行っております。8月からは建物、基礎の撤去を行います。

小山広域保健衛生組合
