

# 豊穂川だより

編集・発行  
小山市役所治水対策課  
小山市中央町 1-1-1  
TEL(22)9329

令和5年4月 第12号

## 1. 一級河川 豊穂川の整備について

豊穂川の河道整備は、令和4年度施工区間約480m（大日橋下流の約120m区間は河道拡幅・築堤、その下流約360m区間は右岸側（市街化調整区域側）の築堤）の工事が完了しました。

令和5年度は、上述した右岸側築堤区間約360mの河道拡幅・築堤工事を非出水期である11月より行います。

大日橋は、用地測量、物件調査が完了しました。令和5年度は事業用地の取得交渉・契約を進め、橋の架け替え工事に着手する予定です。

大行寺橋は、右岸側の取付け道路線形について地権者、関係者へ説明を行っています。令和5年度は事業用地の取得交渉・契約を進め、橋の架け替え工事に着手する予定です。

新川橋は、3月23日に文化センター小ホールにて地権者・関係者を対象に設計説明会を開催しました。新しい橋と取付け道路、工事期間中の迂回路、沿線土地への出入りを確保する側道について説明しました。夏頃から、新川橋架け替え期間における県道交通の迂回路及び仮橋工事に着手します（栃木土木事務所への委託工事）。

河道整備・橋の架け替えとともに令和7年度完成を目指して進めてまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。



河道拡幅・築堤区間の様子

## 2. 小山栃木排水路、立木排水路の整備について

小山栃木排水路（準用河川：島田放水路）は、測量業務委託、地質調査業務委託が完了いたしました。河道・樋門予備詳細設計業務委託は測量や地質調査の結果を基に引き続き進めてまいります。

立木排水路（準用河川：立木川）は調節池の整備に向けて、基本設計業務を行っております。

引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

### 3. 公共下水道事業（大行寺排水区）について


「公共下水道事業（大行寺排水区）」の雨水管の整備につきましては、NO.1 立坑でのマンホール築造作業が3月に完了しました。

1月中旬から進めている、NO.2 立坑からNO.3立坑に向かっての推進作業は、6月中旬に完了する予定です。

雨水管の整備については、当初計画のとおり、令和5年度の完成を目指し、工事を実施してまいります。

また、雨水ポンプ場・調整池の整備につきましては、地方共同法人日本下水道事業団に工事を委託するため、令和5年4月に協定を結ぶ予定です。

令和5年度からの雨水ポンプ場工事の着手に向けて、準備を進めて参りますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

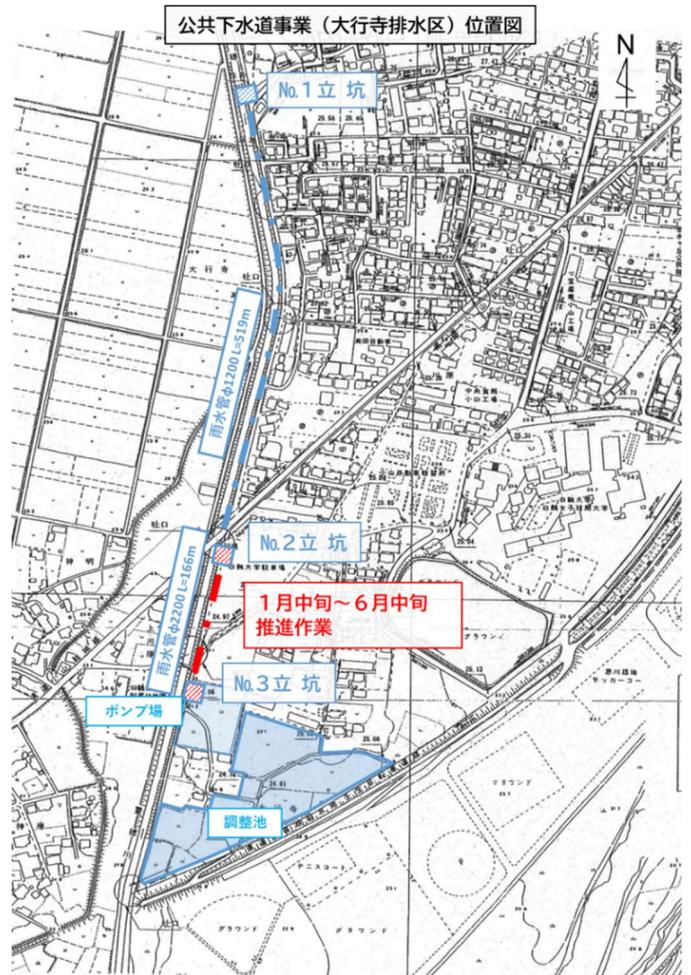

### 4. 田んぼダムの取組みについて

令和4年度に実施した面積と箇所数の集計作業を進めています。現在（本稿作成中の3月中旬においても）田んぼでの取組みを進めていただいております、4月上旬までに土地改良区より実施報告をいただいた後、市において設置場所の確認と集計作業を行います。取組み面積と箇所数は確定次第、ご報告させていただきます。

令和5年度の取組みにつきましても、関係土地改良区及び農家のご協力をいただきながら進めてまいりますので、地域の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

#### 「豊穂川だより」に関するお問い合わせ先

【一級河川 豊穂川の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化整備係 電話 0285-22-9329

【小山栃木排水路、立木排水路の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化企画係 電話 0285-22-9328

【公共下水道事業（大行寺排水区）について】

小山市役所 建設水道部 上下水道施設課 計画係 電話 0285-24-7617

【田んぼダムの取組みについて】

小山市役所 産業観光部 農村整備課 環境整備係 電話 0285-22-9263

小山市 HP <https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/43/1787.html>

