

豊穂川だより

編集・発行
小山市役所治水対策課
小山市中央町 1-1-1
TEL(22)9329

令和5年6月 第13号



1. 一級河川 豊穂川の整備について

豊穂川の河道整備は、令和4年度工事完了区間約120mの法面張芝工事を7月より行います。令和5年度の河道拡幅・築堤工事は、令和4年工事箇所の下流約360m区間を11月の非出水期より行います。

大日橋は、事業用地取得に向けて税務署協議を進めています。協議が完了次第、用地・補償交渉を進め事業用地の取得を行います。

大行寺橋は、右岸側取付け道路と県道との交差点協議を警察と行っています。協議回答を得た後、地権者・関係者へ再度説明を行い、用地・補償交渉を進め事業用地の取得を行います。

新川橋は、令和5年3月に実施した地権者・関係者対象の設計説明会にて新川橋及び取付け道路、側道の整備概要、工事期間中の迂回路・仮橋について説明をしました。現在、迂回路・仮橋工事の着手に向け、用地測量を進めております。

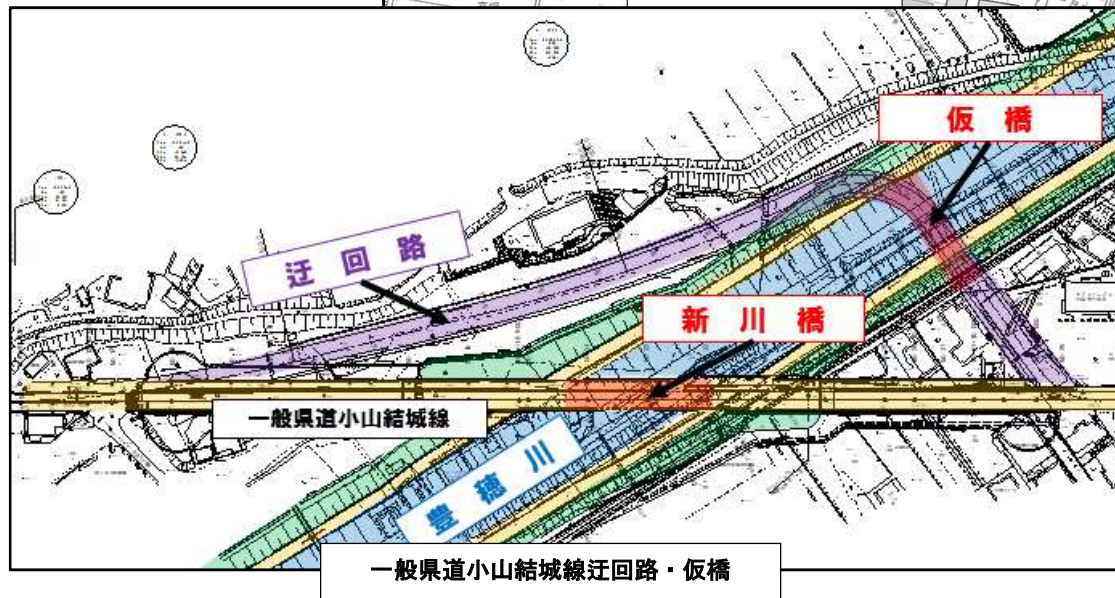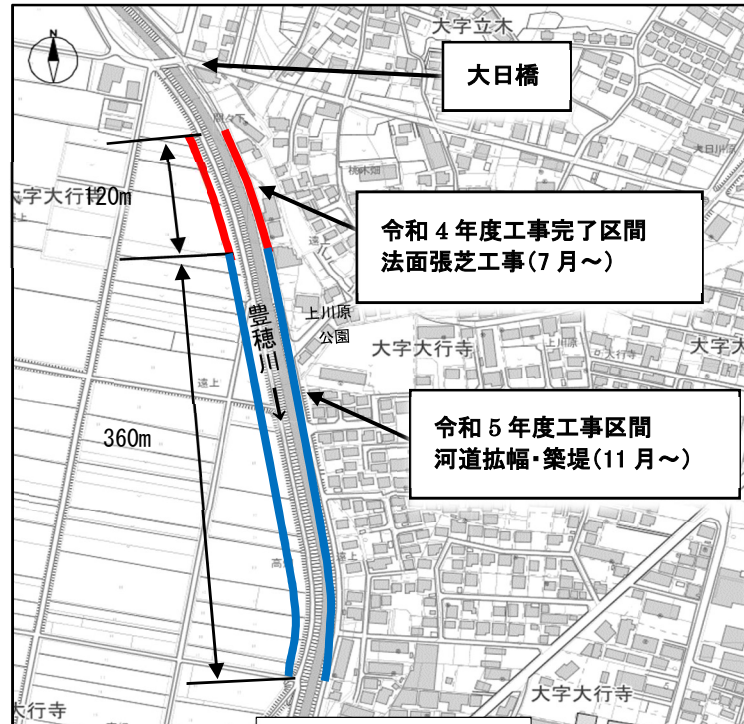

2. 小山栃木排水路、立木排水路の整備について

小山栃木排水路(準用河川：島田放水路)は、河道・樋門予備詳細設計業務委託を令和4年度から引続き進めてまいります。また、河道、調節池の整備に向けて地下水位調査についても進めてまいります。

立木排水路(準用河川：立木川)は調節池の整備に向けて、測量、地質調査、地下水位について進めてまいります。引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


3. 公共下水道事業（大行寺排水区）について

「公共下水道事業（大行寺排水区）」の雨水管の整備につきましては、1月中旬から進めていた、NO.2立坑からNO.3立坑に向かったの推進作業が、5月に完了しました。

6月中旬からNO.3立坑のマンホール築造作業を開始し、令和5年度の完成に向けて、工事を進めてまいります。

また、雨水ポンプ場・調整池の整備につきましては、地方共同法人日本下水道事業団に工事を委託するため、令和5年4月に基本協定を結びました。

6月中に雨水ポンプ場工事の実施協定を結び、工事着手に向けて準備を進めて参りますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

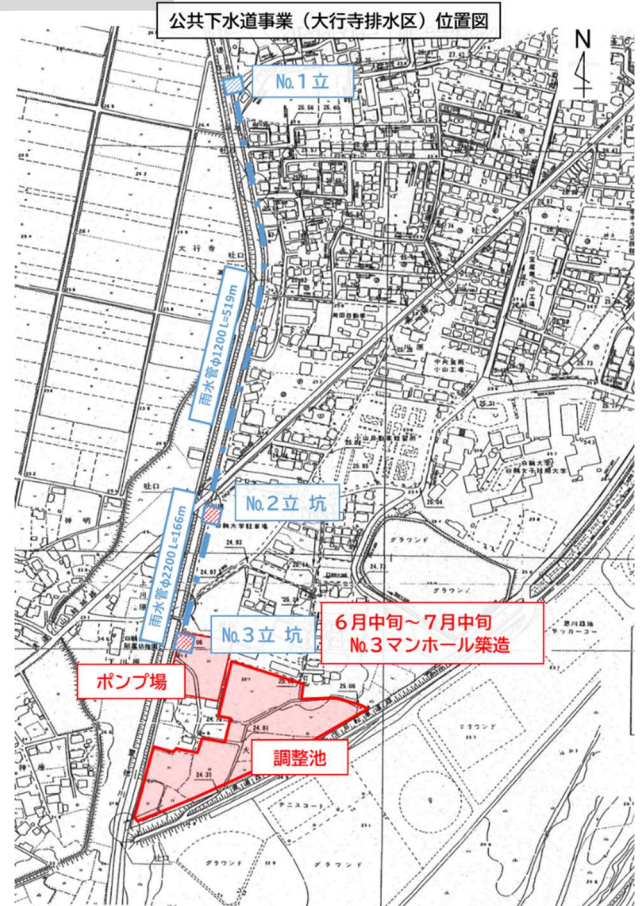

4. 田んぼダムの取組みについて

令和4年度（令和5年3月末まで）に実施した面積と箇所数につきましては現在集計中であり、確定した面積と箇所数をご報告できるよう作業を進めております。

令和5年度の田んぼダムの取組みにつきましては、6月に関係土地改良区と、令和5年度の取組み計画と今後の早期完了に向けた打合せを行う予定です。

引き続き、関係土地改良区及び農家のご協力をいただきながら進めてまいりますので、地域の皆様のご理解とご協力をよろしくをお願いいたします

トピックス

今年度も豊穂川沿いに水のうの設置を行います。水のう設置時は近隣の皆様へご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

「豊穂川だより」に関するお問い合わせ先

【一級河川 豊穂川の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化整備係 電話 0285-22-9329

【小山栃木排水路、立木排水路の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化企画係 電話 0285-22-9328

【公共下水道事業（大行寺排水区）について】

小山市役所 建設水道部 上下水道施設課 計画係 電話 0285-24-7617

【田んぼダムの取組みについて】

小山市役所 産業観光部 農村整備課 環境整備係 電話 0285-22-9263

小山市 HP <https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/43/1787.html>

