

豊穂川だより

令和7年4月 第22号

回 覧

編集・発行
小山市役所治水対策課
小山市中央町 1-1-1
TEL (22)9329

1. 一級河川 豊穂川の整備について

豊穂川の河道拡幅・築堤工事は、令和7年5月までに事業区間約1400mのうち約750mが完了する見込みです。令和7年度は、引き続き事業用地の交渉を進め、取得地から順次整備する予定です。

大日橋架け替えは、令和7年度の下部工工事発注に向けて、引き続き事業用地の交渉を進めております。

大行寺橋架け替えは、令和7年2月に橋台（土台となるコンクリート構造物）2基が完了しました。令和7年度は、現在行っている下部工工事が5月頃完了見込みで、続いて橋桁を架設する上部工工事を行います。橋梁部の完成後、橋に接続する取付道路工事を行う予定です。

新川橋架け替えは、迂回路設置工事が令和7年5月頃に完了する見込みです。それに合わせて現新川橋の通行止め・迂回路への切替を予定していますので、詳細が決まり次第工事看板等にてお知らせいたします。令和7年度は、引き続き事業用地の交渉を進めるとともに、下部工及び旧橋撤去工事に着手する予定です。

引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。



河道整備施工状況 新川橋上流 R7.2月時点



大行寺橋施工状況 橋台(左岸側) R7.2月時点

2. 準用河川 島田川、立木川の整備について

準用河川島田川整備につきましては、令和7年度より市道1119号線、1123号線の新設橋梁工事及び新設樋門工事を予定しております。

上記工事の着手に伴い、6月頃より工事車両が通行するための仮設道路の整備工事を行います。また、現在、工事予定箇所にある排水路、水道管及び農業集落排水管が工事の支障になることから、工事に影響のない位置へと切回し工事を併せて行います。

準用河川立木川は、令和7年度は用地買収に取り掛かるための用地測量や補償物件調査を行います。

引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。




準用河川立木川パース図

3. 公共下水道事業（大行寺排水区）について

「公共下水道事業（大行寺排水区）」の雨水ポンプ場の整備につきましては、ポンプピット躯体を造る作業のほか、3月に着手した自家発電機棟の建築工事を行っております。また、雨水ポンプ場の設備工事は、資器材の調達及び機器製作を進めております。

調整池建設工事につきましては、遮水矢板の打設作業を進めております。

施工時には騒音・振動等ご迷惑をお掛けいたしますが、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

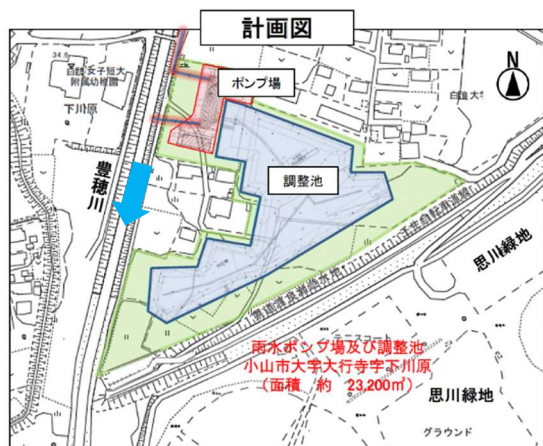

4. 田んぼダムの取組みについて

令和6年度に実施した面積と箇所数の集計および確認作業を進めています。取組み面積と実施箇所数は確定次第ご報告させていただきます。

また、市外上流部の取組みについて、3月に栃木市担当課及び関係土地改良区と打ち合わせを行い、令和7年度の取組み拡大に向けて進めて行くことを確認しました。

令和7年度の取組みにつきましても、関係土地改良区及び農家のご協力を頂きながら進めてまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

「豊穂川だより」に関するお問い合わせ先

【一級河川 豊穂川の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化整備第一係 電話 0285-22-9329

【準用河川 島田川、立木川の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化整備第二係 電話 0285-22-9825

【公共下水道事業（大行寺排水区）について】

小山市役所 建設水道部 下水道施設課 計画係 電話 0285-24-7617

【田んぼダムの取組みについて】

小山市役所 産業観光部 農村整備課 環境整備係 電話 0285-22-9263



小山市 HP <https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/bosai-bohan/bosai/haisui/>
